

RESUMEN DE OBRAS MARZO DE 2019

➔ AVANCE DE OBRAS EN MIGUES, SAN JACINTO Y TALA



Obra de Bypass de Tala



Obras en San Jacinto



Obra de consolidación de Migues

➔ OBRAS EN MONTES

En el Municipio de Montes, se está trabajando en los barrios RAUSA, Nuevo, Las Ranas, MEVIR 1 y el Porvenir. Las tareas que se están ejecutando son conformación de cunetas, limpieza de pluviales existentes, perfilado, aporte con material y compactación.



PAVIMENTACIÓN DE CAMINO LOS INGLESES EN AGUAS CORRIENTES

La Dirección General de Obras está en la etapa final de la ejecución de una obra de pavimentación en camino Los Ingleses que une Aguas Corrientes con Ruta 46.

La obra, que se está realizando por Administración, consiste en la colocación de tratamiento bituminoso doble en una extensión de 2.300 m.

En el inicio se hizo la limpieza de cunetas, se sustituyeron todos los cruces de caños existentes, luego la imprimación, y actualmente se está trabajando en el segundo sellado con piedras. Para finalizar la obra resta realizar el sellado con arena.



ACTUALIZACIÓN DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA VIAL E HIDRÁULICA EN CESAR MAYO GUTIÉRREZ Y LUIS BATLLE BERRES (EX MUNICIPIO)



Se realizaron cruces de pluviales, uno de ellos atraviesa la calle Atanasio Sierra y es de 600mm, el resto de las tuberías atraviesan ex Municipio en las calles: Colman (un cruce de 600mm), Meléndez (cruces de 600mm y de 500mm), Atanasio Sierra (un cruce de 800mm), Ramón Ortiz (cruces de 800mm), Juan P. López (cruces de 600mm y 500mm).

Como obra anexa de desagüe, se trabaja en la limpieza y conformación de cunetas en la calles Meléndez, Ramón Ortiz y Juan P. López. Estos trabajos incluyen la colocación de losetas de hormigón para las entradas peatonales y de tuberías para las entradas vehiculares.

En la zona de los cementerios (ex Municipio casi Aldabalde) se continúa con las obras necesarias para el correcto escurrimiento de las aguas superficiales que allí llegan. Estas obras incluyen: bocas de tormenta (que se encuentran en su mayoría finalizadas), un colector bajo calzada y varias cámaras de inspección del mismo.



OBRA COLECTOR PLUVIAL 18 DE MAYO



- Durante los meses de febrero y marzo se comenzó con la línea de pluvial de 800 sobre Av. Maestro Julio Castro y Padre José Novoa.
- Avance con los badenes de hormigón armado sobre el pluvial de 1200 en la calle Grito de Asencio, al momento se han realizado 150 m.
- Colocación de 185 m de pluvial de 800.
- Realización de 6 cámaras completas de las 8 previstas por calle Grito de Asencio.
- Se está trabajando en el armado de las 12 cámaras de hormigón armado previsto en Av. Castro.



OBRA DE INFRAESTRUCTURA VIAL E HIDRÁULICA DR. ENRIQUE POUHEY-AV JOSÉ ARTIGAS - LAS PIEDRAS, 18 DE MAYO Y PROGRESO

Avanza la obra en el tramo correspondiente al Municipio de Progreso, donde ya está colocada la segunda capa de asfalto que va desde el km 32 hasta la cercanía del centro de Progreso, se ejecutaron los cordones en las calles Av. Artigas y Simón Bolívar, también se estuvo trabajando en las tuberías y en la construcción en la senda peatonal y cilecoviá.

La obra de infraestructura vial e hidráulica de Av. Dr Enrique Pouey - Av. Artigas se extiende desde la calle Colibrí en Las Piedras y la Ruta Nº 5, con una extensión de 8,6 km.



OBRAS EN EL SANTORAL

San Antonio

Avanzando con el Plan de Caminería Rural, se está realizando el mantenimiento de camino Cardozo y camino Cazot.

En las calles Aparicio Saravia y Nogara se está trabajando en la construcción de cabezales y entradas particulares, faltando solo el sellado con arena para culminar el tratamiento bituminoso doble.



Santa Rosa

Consolidación barrial: construcción de cordón cuneta en Lavalleja y 18 de Julio entre Herrera y T. Berreta.



San Bautista

Finalizando la obra se continúa con el tratamiento bituminoso doble, en una extensión de unos 400m. Se está realizando la segunda etapa de riego de piedra, en las calles Maraboto y Fariña.

San Ramón

Mantenimiento y limpieza de canales y cunetas, se ha realizado 2500m de canalización. Barrio Curbelo: limpieza de cunetas y recargo en tosca de las calles de todo el barrio.



➔ INTERVENCIONES VIALES E HIDRÁULICAS EN COSTA DE ORO


En el marco de la obra de infraestructura vial e hidráulica que se está realizando en Salinas Norte, avanzan los trabajos de micro y macro drenaje en la calle San Salvador. En esta etapa se está realizando la conformación del canal, la ejecución de los drenajes y la colocación de cabezales en las entradas vehiculares a los domicilios. Asimismo, comenzaron las tareas para la regularización en la plaza de Av. Zapicán y San Salvador.

En Salinas Sur continúa la obra hidráulica de la calle Pitanga entre rambla y calle Ñandú. La obra consiste en la construcción de un drenaje subterráneo a ambos lados de la calle. Al momento se llevan ejecutados 640 m de este dren.

En Atlántida, tras la pavimentación de Av. Pinares, avanza la construcción de senderos peatonales y fondos en hormigón para drenajes.



➔ OBRAS EN LOS MUNICIPIOS DE SOCA Y LA FLORESTA

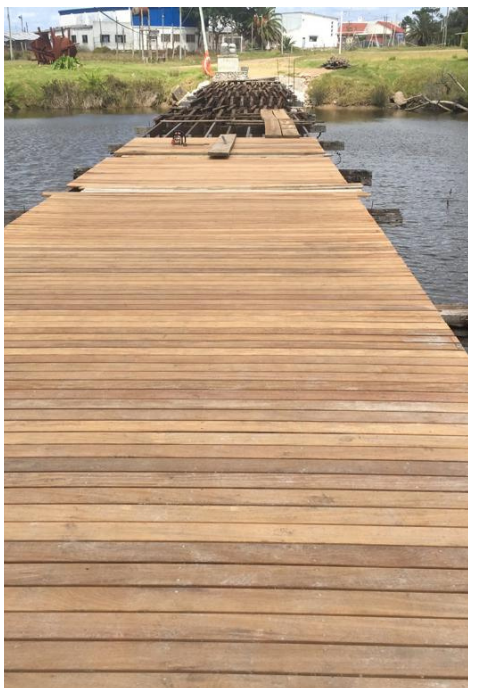

En Soca se vienen realizando tareas de cruce de caños y sustitución en calle Battle y Ordóñez. Por su parte, se está realizando la reparación del viejo puente peatonal de madera La Floresta – Costa Azul.



OBRAS EN CIUDAD DE LA COSTA



* Pavimentación en avenidas principales de Solymar y Lagomar Norte

En el marco del proyecto de Consolidación de Ciudad de la Costa, se está realizando la pavimentación de las avenidas principales en Lagomar Norte y Solymar Norte. Se realizará el tendido de asfalto en República Argentina entre Auxiliar Giannattasio y República Dominicana y en Varela entre Márquez Castro y República Dominicana.

En tanto, en Lagomar se están realizando las tareas previas a la pavimentación de Luis Batlle Berres entre Arocena y Ruta Interbalnearia.



* Obras en Pinar Sur, Solymar Norte, Colinas de Solymar, Paso Carrasco y Nicolich

Se viene ejecutando limpieza de cunetas, perfilado y recargo de varias calles para la rehabilitación luego de las lluvias. Se utilizó la retro giratoria para realizar la limpieza de varios puntos de descarga de pluviales en Ciudad de la Costa y Nicolich.



* Obras en camino de Los Horneros en Municipio de Nicolich

Las tareas que se han ejecutado son: excavación, colocación de drenes (sistema de desagüe de pluviales que implica la colocación de geotextil), tendido de material granular, para posteriormente asfaltar el camino.

➔ CANELONES SE ILUMINA

Municipio de J. Suárez

Total de luminarias a encender: 97
(51 luminarias de Sodio y 46 luminarias de LED).

Municipio de Las Piedras

Son 112 luminarias LED instaladas en Las Piedras, barrio Santa Isabel.

Municipio de San Bautista

Iluminación de la Cancha de BBFF del Club Vida Nueva.

Municipio Nicolich

33 Luminarias LED 50 w.

